Протокол
испытания пожарных гидрантов

30.09.2026г.

Наименование эксплуатирующей организации:

СНТ «Орлиные Холмы»
(в пределах закрепленного противопожарного оборудования)

Наименование организации проводящей испытания: ООО «ПК АТЛАНТ»

Дата и время испытаний: 30.09. 2026г. 12 ч. 00 мин.
Комиссия в составе:

Председателя:

генеральный директор ООО «ПК АТЛАНТ» Овчинников А. Н.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии:

инженер по пожарной безопасности Панфилов А.В.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

инженер по пожарной безопасности Манапбаев Т.Б.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания пожарного гидранта:

На территории объекта: Московская область, городской округ Чехов, коттеджный посёлок Орлиные Холмы

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ НА ВОДООТДАЧУ

30.09.2026г. **Московская область**

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «ПК Атлант» составили настоящий акт в том, что 30.09.2026г. произведена проверка пожарных гидрантов на водоотдачу в количестве 18 ПГ

Проверкой осмотрены пожарные гидранты:

№ п/п	*Наименование*	*Количество*	*Примечание*
1.	Осмотрено пожарных гидрантов	18	-
2.	Обнаружено неисправных пожарных гидрантов	0	-
3.	Исправлено гидрантов	18	-
4.	Обнаружено замороженных гидрантов	0	-

Проверка качественного показателя визуально.				
Крышка колодца	Расстояние от крышки прибора до крышки колодца	Состояние квадрата штанги, его корпуса, стыковочного соединения	Анализ клапана на герметичность (работа запорной арматуры)	Наличие воды в гидротехническом сооружении
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует
присутствует	50 см	норма	норма	Отсутствует

1. Отсутствие грязи, льда, снега на крышки колодца: **соответствует.**
2. Наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток: **соответствует.**
3. Возможность беспрепятственного подъезда к гидранту: **соответствует.**
4. Работа сливного устройства: **соответствует.**

Произведено испытание пожарных гидрантов на водоотдачу:

Вид испытаний гидранта: сокращенный - согласно присутствующему комплекту оборудования (пожарная колонка, гидротестер, емкость)

№ ПГ	Адрес расположения	Диаметр и вид сети (мм)	Давление в сети (Атм.)	Водоотдача (л/с)	МР ВНИИПО МЧС России
1	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №44	Т-200	2,8	103	Соответ.
2	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №96	Т-200	2,8	103	Соответ.
3	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №111	Т-200	2,8	103	Соответ.
4	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №250	Т-200	2,8	103	Соответ.
5	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №260	Т-200	2,8	103	Соответ.
6	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №268	Т-200	2,8	103	Соответ.
7	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №365	Т-200	2,8	103	Соответ.
8	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №348а	Т-200	2,8	103	Соответ.
9	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №319	Т-200	2,8	103	Соответ.
10	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №277	Т-200	2,8	103	Соответ.
11	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №311	Т-200	2,8	103	Соответ.
12	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №459	Т-200	2,8	103	Соответ.
13	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №228	Т-200	2,8	103	Соответ.
14	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №191	Т-200	2,8	103	Соответ.
15	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №163	Т-200	2,8	103	Соответ.
16	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №130	Т-200	2,8	103	Соответ.
17	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №108	Т-200	2,8	103	Соответ.
18	МО, г.о. Чехов, д. Красные орлы, СНТ Орлиные холмы, уч. №238	Т-200	2,8	103	Соответ.

Заключение: Пожарные гидранты обеспечены свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, находятся в технически исправном состоянии и пригодны для использования в целях пожаротушения.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ СНТ «ОРЛИНЫЕ ХОЛМЫ»

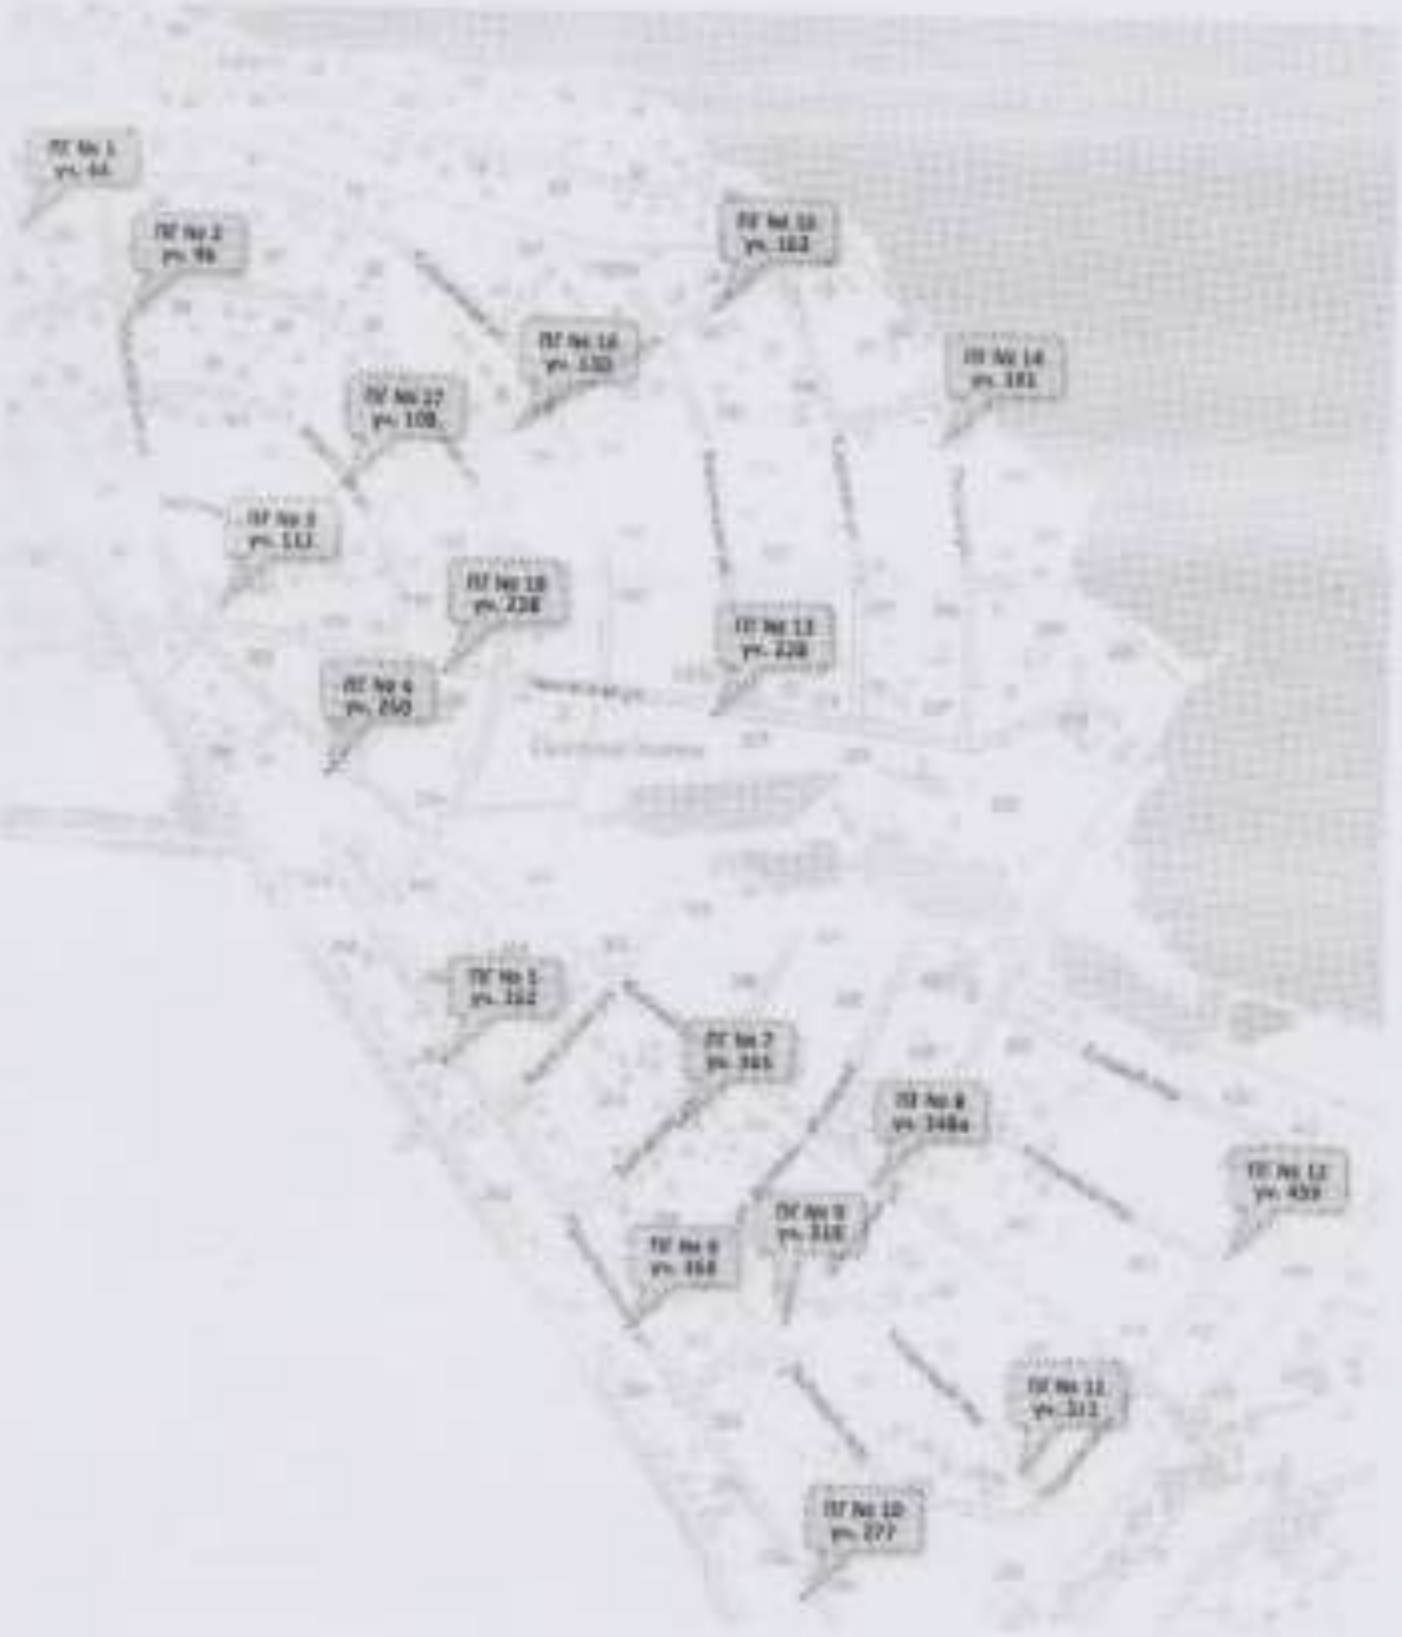

Акт составлен в 2 экземплярах – по одному каждой стороне.

Испытания провели:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Овчинников А.Н.

Панфилов А.В./

Манапбаев Т.Б.

Нормативная база:

СП 10.13130.2020 – «Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод нормы и правила проектирования»

Методика проверки сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу 2003 г. (Разработан Санкт-Петербургским филиалом ФГУ ВНИИПО МЧС России, отделом организации пожаротушения ГУГПС МЧС России).

ГОСТ Р 53961-2010 - Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 12.2.037-78 - Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности.

ГОСТ Р 53250-2009 - Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
(наименование лицензирующего орган)

Информация
из реестра лицензий по состоянию на 15:27 06.08.2026

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-77/05815972

3. Дата предоставления лицензии: 04.08.2026

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ", (ООО ПК "АТЛАНТ"), ОГРН: 1217700032846

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 9724035759

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
г. Москва, ул. Кантемировская, д. 59А

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных

преградах

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ ГУ МЧС России по г. Москве от 04.08.2026 № 881

Документ носит информационный характер

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Колонка пожарная КП (далее колонка) изготовлена из алюминиевого сплава АК12М2 по ГОСТ 1583 и предназначена для открывания (закрывания) подземного гидранта и присоединения пожарных рукавов с целью отбора воды из водопроводных сетей на пожарные нужды.

Колонка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колонка изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ [illegible]-2022.

Основные параметры и размеры колонки указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Норма
Рабочее давление, МПа (кгс/см²), не более	1,0 (10)
Условный проход, мм	
входного патрубка	125
напорного патрубка	80
Число напорных патрубков, шт.	2
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	10
Габаритные размеры, мм, не более	
Длина (по [illegible])	430
Ширина ([illegible])	190
Высота	1070
Масса, кг, не более	15

Примечание:

[illegible]

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

С каждой колонкой прилагается паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Колонка состоит из следующих основных частей (рис.1): корпуса нижнего 1, корпуса верхнего 2, ключа 3, вентилей 6 с головками соединительными 7.

Нижний и верхний корпуса соединены между собой болтами и уплотнены резиновым уплотнительным кольцом 8.

В нижней части колонки имеется резьбовое кольцо 11 с внутренней специальной резьбой, предназначенное для завертывания колонки на пожарный подземный гидрант.

В верхней части колонки имеются два вентиля 6 с условным проходом Ду 80 мм, предназначенные для перекрытия и регулирования потока воды, проходящей через напорные патрубки.

На напорных патрубках закреплены соединительные головки ГМ-80.

Через колонку проходит ключ 3, предназначенный для открывания клапана гидранта.

Колонка имеет блокировку, исключающую возможность повернуть ключ при открытых вентилях. Блокировка осуществляется за счет того, что при открытом вентиле его маховик не дает возможности повернуть ключ для открывания клапана гидранта.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Установите колонку на резьбовой штуцер гидранта и завинтите до упора. Подсоедините рукавные линии. После этого, поворотом ключа колонки, откройте клапан гидранта.

Открывание клапана гидранта производите в два приема:

- откройте клапан гидранта поворотом ключа колонки на 1-2 оборота и заполните колонку водой. Наполнение колонки происходит за короткий промежуток времени, в течение которого слышен шум поступающей в нее воды;

- после прекращения шума, откройте полностью клапан гидранта, после чего, вращением маховиков откройте вентили напорных патрубков колонки.

Закрывание клапана гидранта следует производить только при закрытых вентилях напорных патрубков колонки.

6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническое состояние колонки в [illegible] от применения ее [illegible], соответствующими [illegible] технического обслуживания и консервации [illegible].

Для своевременного предупреждения [illegible] неисправностей устанавливаются виды [illegible] обслуживания, приведенные в табл. 2.

КОПИЯ ВЕРНА
